ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1		**Izgradnja**	**684 days?**	**Thu 01.08.19**	**Tue 15.03.22**
2		**Pogodba**	**684 days?**	**Thu 01.08.19**	**Tue 15.03.22**
3		Gradnja	423 days?	Thu 01.08.19	Mon 15.03.21
4		**Pripravljalna dela**	**377 days**	**Thu 01.08.19**	**Fri 08.01.21**
8		**Izvedba del**	**330 days**	**Thu 05.12.19**	**Wed 10.03.21**
9		**kanal K3 - 973,10m**	**133 days**	**Mon 03.02.20**	**Wed 05.08.20**
10		**Izkop, vgradnja cevi, zasip, gramoz, tampon**	**118 days**	**Mon 03.02.20**	**Wed 15.07.20**
11		jašek K17a-K15 50m	10 days	Mon 03.02.20	Fri 14.02.20
12		jašek K14-K15 s podbojem 33,34m	10 days	Mon 17.02.20	Fri 28.02.20
13		izpust v Mežo	4 days	Thu 20.02.20	Tue 25.02.20
14		jašek K20-K21 55,27m	6 days	Mon 02.03.20	Mon 09.03.20
15		jašek K21-K22 53,63m	6 days	Tue 10.03.20	Tue 17.03.20
16		Jašek K22-K24 77,02m	7 days	Wed 18.03.20	Thu 26.03.20
17		jašek K24-K26 91,46m	11 days	Fri 27.03.20	Fri 10.04.20
18		jašek K26- K27 100,55m	17 days	Mon 13.04.20	Tue 05.05.20
19		jašek K27-K30 103,31 m	18 days	Wed 06.05.20	Fri 29.05.20
20		jašek K30-K33A 90,56m	13 days	Mon 01.06.20	Wed 17.06.20
21		jašek K33-K35 147,49 m	20 days	Thu 18.06.20	Wed 15.07.20
22		Preizkus tesnosti kanalizacije	2 days	Thu 16.07.20	Fri 17.07.20
23		Pregled s kamero	1 day	Mon 20.07.20	Mon 20.07.20
24		Predpriprava za asfaltiranje trase	9 days	Tue 21.07.20	Fri 31.07.20
25		Izvedba asfalterskih del	3 days	Mon 03.08.20	Wed 05.08.20
26		**kanal C in W - 963,70 m**	**304 days**	**Thu 05.12.19**	**Tue 02.02.21**
27		**kanal CR in C**	**294 days**	**Thu 19.12.19**	**Tue 02.02.21**
28		izpust - jašek 2 - 179,06m'	40 days	Thu 19.12.19	Wed 12.02.20
29		jašek2-jašek 4 - 121,95 m'	20 days	Thu 13.02.20	Wed 11.03.20
30		jašek 4-jaše5 - 95,21m'	19 days	Thu 12.03.20	Tue 07.04.20
31		jašek 5-jašek 8 -113,55m'	20 days	Wed 08.04.20	Tue 05.05.20
32		jašek 8- jašek 11 - 94,31 m'	18 days	Wed 06.05.20	Fri 29.05.20
33		jašek 11-jašek 13 - 89,26m'	18 days	Tue 01.12.20	Thu 24.12.20
34		jašek 11-jašek 15 - 101,39m'	20 days	Fri 25.12.20	Thu 21.01.21
35		jašek 15- jašek 17 - 44,82m'	8 days	Fri 22.01.21	Tue 02.02.21
36		**Razbremenilni bazen R-2**	90 days	Thu 12.03.20	Wed 15.07.20
37		**kanal W**	**258 days**	**Thu 05.12.19**	**Mon 30.11.20**
38		jašek 1-jašek2 - 66,18m'	13 days	Thu 19.12.19	Mon 06.01.20
39		jašek2-jašek3 - 53,44m'	10 days	Thu 05.12.19	Wed 18.12.19
40		jašek 3- RUB - 15,46m'	3 days	Thu 26.11.20	Mon 30.11.20
41		**RUB BAZEN**	104 days	Fri 17.07.20	Wed 09.12.20
42		**Asfalterska dela**	85 days	Fri 20.03.20	Wed 10.03.21
43		**kanal KR - 168,30m**	30 days	Thu 16.07.20	Wed 26.08.20
44		**kanal L0 - 453,90m**	70 days	Thu 27.08.20	Wed 02.12.20
45		**Kanal K1 - 467 m**	70 days	Thu 03.12.20	Wed 10.03.21
46		**Kanal D - 559,20m**	**15 days**	**Mon 27.01.20**	**Fri 14.02.20**
47		jašek 5-jašek 8 -113,55m'	12 days	Thu 30.01.20	Fri 14.02.20
48		jašek 5-jašek 2 -140m1	14 days	Mon 27.01.20	Thu 13.02.20
49		**Kanal BB in BP - 205,14 m**	**18 days**	**Mon 02.03.20**	**Wed 25.03.20**
50		jašek 4- jašek 10	18 days	Mon 02.03.20	Wed 25.03.20
51		**Kanal BA - 515,60m**	**25 days**	**Mon 27.01.20**	**Fri 28.02.20**
52		jašek 14 - jašek 17	5 days	Mon 27.01.20	Fri 31.01.20
53		jašek 17 - jašek 21	10 days	Mon 03.02.20	Fri 14.02.20
54		jašek 4 - jašek 7	10 days	Mon 17.02.20	Fri 28.02.20
55		**Kanal E**	30 days	Mon 10.08.20	Fri 18.09.20
56		**Kanal N1**	30 days	Mon 10.08.20	Fri 18.09.20
57		**Končanje del**	**47 days?**	**Fri 08.01.21**	**Mon 15.03.21**
58		Izdelava PID dokumentacija	23 days	Fri 08.01.21	Tue 09.02.21
59		Interni tehnični pregled	1 day	Wed 10.02.21	Wed 10.02.21
60		Vloga za UD	1 day?	Thu 11.02.21	Thu 11.02.21
61		Tehnični pregled	21 days	Fri 12.02.21	Fri 12.03.21
62		Primopredaja del	1 day?	Mon 15.03.21	Mon 15.03.21
63		Garancijska doba	261 days	Tue 16.03.21	Tue 15.03.22

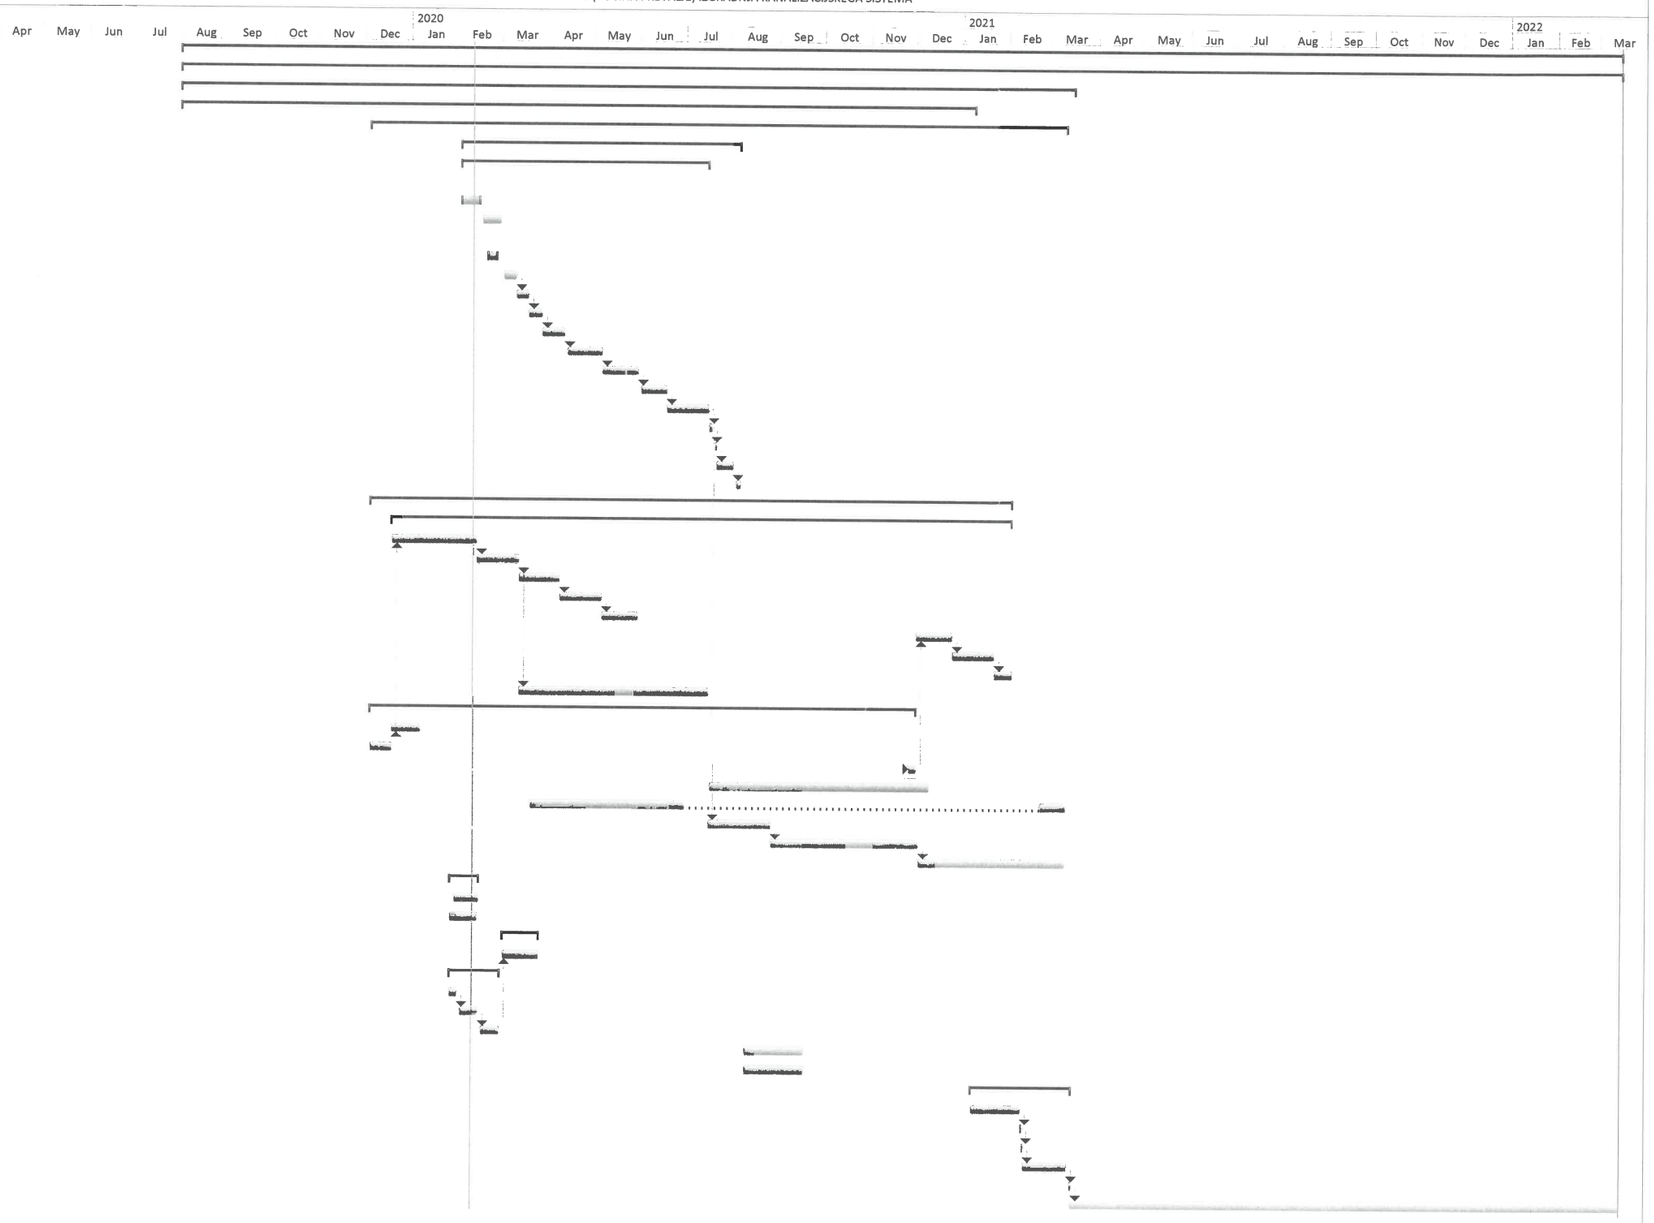

Project: 23122019 terminski plan
Date: Tue 11.02.20

Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Ročno napredovanje
Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Deadline
Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress

HIS gradbeni[illegible]ing d.o.o.
Vodovodna [illegible] 1000 Ljubljana
