Vodilni partner: ESOT - INVEST

Partner: GRADNJE

ESOT-INVEST, družba za ravnanje z energetskimi resurs... izvajanje ekoloških in energ... projektov, d o.o.

TERMINSKI PLAN

PROJEKT: »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE) - IZGRADNJA CČN PREVALJE«

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

ID	Aktivnost	Koledar. dni	Začetek	Konec
0	**IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE PREVALJE**	**0**	**Thu 24.10.19**	**Thu 4.5.23**
1	**Podpis pogodbe**	1	Thu 24.10.19	Thu 24.10.19
2	**Rok za predložitev garancije za dobro izvedbo**	11	Fri 25.10.19	Mon 4.11.19
3	**Datumu začetka**	1	Tue 5.11.19	Tue 5.11.19
4	**Rok za predložitev zavarovanj in terminskega plana**	28	Wed 30.10.19	Tue 26.11.19
5	**Projektiranje in izgradnja**	**0**	**Tue 5.11.19**	**Fri 30.4.21**
6	Idejna zasnova	7	Tue 5.11.19	Tue 12.11.19
7	Pregled idejne zasnove s strani inženirja	21	Wed 13.11.19	Tue 3.12.19
8	Pridobivanje projektnih pogojev	63	Fri 29.11.19	Thu 30.1.20
9	Dokumentacija za gradbeno dovoljenje	59	Tue 3.12.19	Fri 31.1.20
10	Preglede DGD s strani inženirja	21	Fri 31.1.20	Fri 21.2.20
11	Pridobitev gradbenega dovoljenja	63	Fri 21.2.20	Fri 24.4.20
12	Projekt za izvedbo	88	Fri 31.1.20	Tue 28.4.20
13	Preglede PZI s strani inženirja	21	Tue 28.4.20	Tue 19.5.20
14	Ureditev gradbišča	14	Tue 28.4.20	Tue 12.5.20
15	Ureditev dostopne ceste	27	Tue 19.5.20	Mon 15.6.20
16	Oskrba s pitno vodo	14	Mon 1.6.20	Mon 15.6.20
17	Dovod električne energije	10	Fri 5.6.20	Mon 15.6.20
18	Dovod telekomunikacijskega kabla	10	Fri 5.6.20	Mon 15.6.20
19	Zemeljska dela za upravno zgradbo in bazenski del	39	Mon 15.6.20	Fri 24.7.20
20	Betonska in armiranobetonska dela za bazene	82	Fri 24.7.20	Wed 14.10.20
21	Gradbena dela za upravno zgradbo	98	Fri 24.7.20	Fri 30.10.20
22	Potrditev strojne in elektro opreme	21	Tue 28.4.20	Tue 19.5.20
23	Dobava strojne opreme	213	Tue 19.5.20	Fri 18.12.20
24	Montaža strojne opreme	126	Fri 30.10.20	Fri 5.3.21
25	Dobava elektro opreme	98	Fri 11.9.20	Fri 18.12.20
26	Montaža elektro opreme	105	Fri 20.11.20	Fri 5.3.21
27	Zunanja ureditev	153	Fri 30.10.20	Thu 1.4.21
28	Izdelava programa in SCADA	42	Fri 22.1.21	Fri 5.3.21
29	Zagon čistilne naprave	21	Fri 5.3.21	Fri 26.3.21
30	Projekt izvedenih del	40	Mon 15.2.21	Fri 26.3.21
31	Izdelava POV, NOV	40	Mon 15.2.21	Fri 26.3.21
32	Preglede PID s strani inženirja	22	Mon 29.3.21	Mon 19.4.21
33	Tehnični pregled	1	Wed 21.4.21	Wed 21.4.21
34	Odprava pomanjkljivosti s tehničnega pregleda	9	Thu 22.4.21	Fri 30.4.21
35	**Poskusno obratovanje**	**365**	**Wed 5.5.21**	**Wed 4.5.22**
36	**Rok za reklamacijo napak**	**365**	**Thu 5.5.22**	**Thu 4.5.23**

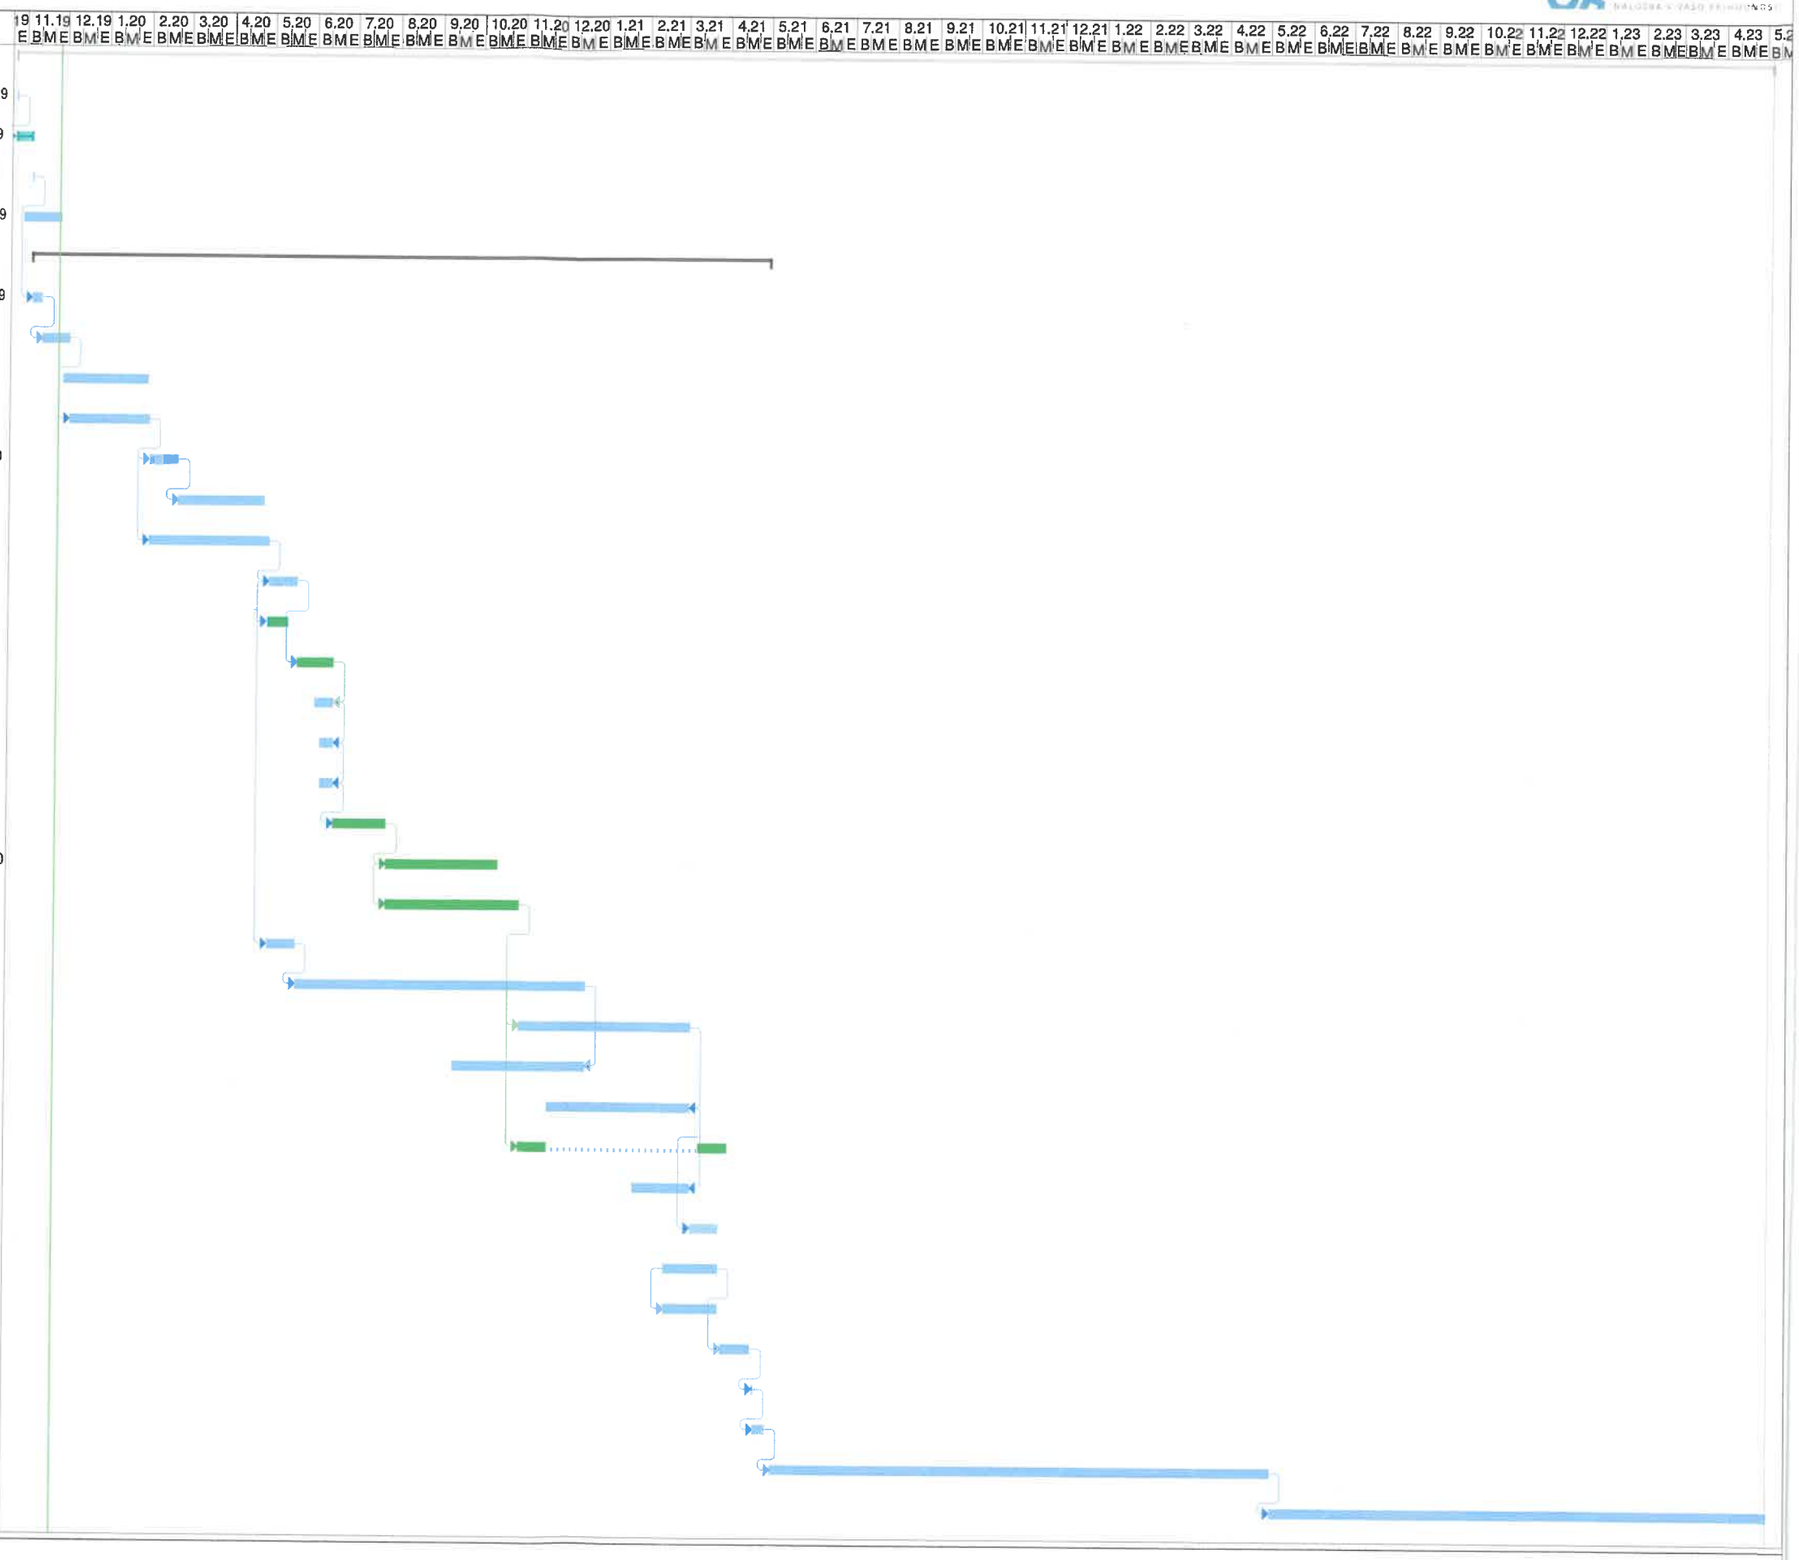

Celje, Tue 26.11.19
